

## Dezernat Finanzen und Service

### **Umsetzungsstand des Förder- programms „Brücken in die Zukunft“**

**VwV Investkraft (Teil I),  
VwV Invest Schule (Teil II) -  
im Landkreis Zwickau (Berichtsjahr 2022)**

**InfoV/530/2022**

## A. Brücken in die Zukunft - VwV Investkraft (Teil I)

Mit dem im Jahre 2016 initiierten Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“ stehen dem Freistaat Sachsen ca. 800 Mio. EUR für Investitionen und die energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur, dem Bau und Ausbau von Kindertagesstätten oder dem Straßenbau zur Verfügung. Das Budget stammt aus Bundes-, Landes- und FAG-Mitteln der Kommunen und wird den Landkreisen, Städten und Gemeinden in drei Blöcken zur Verfügung gestellt: der Investitionspauschale (zum Einsatz eigener Investitionen oder der Kofinanzierung geförderter Projekte) sowie dem Budget „Bund“ und dem Budget „Sachsen“, welche in der VwV Investkraft kodifiziert sind. Für Letztere entfallen auf den Landkreis Zwickau anteilig ca. 40 Mio. EUR. Diese werden als nicht rückzahlbarer Zuschuss i. H. v. bis zu 75 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gewährt.<sup>1</sup> 35 Prozent der insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel dienen der Realisierung landkreiseigener Projekte, 65 Prozent für Einzelmaßnahmen kreisangehöriger Gemeinden und Städte.

Innerhalb des dem eigentlichen Antrags- und Bewilligungsverfahren vorgeschalteten Maßnahmeplanverfahrens wurden insgesamt 264 Einzelmaßnahmen (inkl. Ersatzmaßnahmen) eingereicht und durch die Landkreisverwaltung auf Plausibilität (z. B. Wahl des Fördergegenstandes und Schlüssigkeit der Gesamtfinanzierung) geprüft. Von den 264 Einzelmaßnahmen wurden 163 Einzelmaßnahmen in den Investitionsplan aufgenommen.

Es wurde sich verständigt, das Anpassungsverfahren zweimal jährlich durchzuführen, um den Mittelabfluss und damit auch die Budgetanspruchnahme bis zum Ende der Bewilligungszeiträume (Budget „Bund“: 31. Dezember 2021; Budget „Sachsen“: 31. Dezember 2021, in begründeten Ausnahmefällen: 31. Dezember 2023)<sup>2</sup> garantieren zu können.

Unter Berücksichtigung der bisher realisierten Anpassungsverfahren stellt sich die Situation chronologisch wie folgt dar:

**Tabelle 1: VwV Investkraft – Chronologischer Ablauf**

	Budget „Bund“		Budget „Sachsen“	
Verfügbares Budget (in €)	9.390.734,00		30.561.832,00	
Stand Investitionsplan vom:	Untersetztes Budget (in €)	Anzahl Maßnahmen	Untersetztes Budget (in €)	Anzahl Maßnahmen
14. Juni 2016 (Originärer Maßnahmeplan)	9.390.734,00	57	30.561.832,00	106
15. Mai 2017 (I. Anpassungsverfahren)	9.390.734,00	57	30.561.832,00	104
23. November 2017 (II. Anpassungsverfahren)	9.390.734,00	55	30.533.457,00	102
4. Mai 2018 (III. Anpassungsverfahren)	9.390.734,00	55	30.561.136,98	102
21. Dezember 2018 (IV. Anpassungsverfahren)	9.349.638,41	54	30.511.814,66	102
18. April 2019 (V. Anpassungsverfahren)	9.388.043,29	55	30.561.832,00	103
4. September 2019 (VI. Anpassungsverfahren)	9.387.873,85	55	30.390.823,22	102

<sup>1</sup> Vgl. Großbuchstabe B Ziffer IV Nr. 3 VwV Investkraft bzw. Großbuchstabe C Ziffer IV Nr. 3 VwV Investkraft

<sup>2</sup> Vgl. Großbuchstabe B Ziffer III Nr. 1 Kleinbuchstabe e VwV Investkraft bzw. Großbuchstabe C Ziffer III Nr. 1 Kleinbuchstabe b VwV Investkraft

	Budget „Bund“		Budget „Sachsen“	
Verfügbares Budget (in €)	9.390.734,00		30.561.832,00	
<b>Stand Investitionsplan vom:</b>	<b>Untersetztes Budget (in €)</b>	<b>Anzahl Maßnahmen</b>	<b>Untersetztes Budget (in €)</b>	<b>Anzahl Maßnahmen</b>
10. Dezember 2019 (VII. Anpassungsverfahren)	9.387.639,08	55	30.537.898,29	102
9. April 2020 (VIII. Anpassungsverfahren)	9.390.734,00	56	30.542.427,63	103
18. August 2020 (IX. Anpassungsverfahren)	9.390.734,00	56	30.561.831,99	104
8. Dezember 2020 (X. Anpassungsverfahren)	9.301.231,40	55	30.561.832,00	104
20. April 2021 (XI. Anpassungsverfahren)	9.390.734,00	58	30.561.832,00	104
6. September 2021 (XII. Anpassungsverfahren)	9.390.392,21	58	30.561.832,00	104
8. Dezember 2021 (XIII. Anpassungsverfahren)	9.390.392,21	58	30.561.832,00	104
31. August 2022 (XIV. Anpassungsverfahren)	9.390.734,00	58	30.561.379,96	104

Im XIV. Anpassungsverfahren konnten die dem Landkreis Zwickau zur Verfügung stehenden Mittel im Budgetteil „Bund“ nach fristgerechtem Abschluss aller Maßnahmen vollumfänglich untersetzt werden.

Im aktuellen noch laufenden Verfahren (XV. Anpassungsverfahren) wurden seitens der kreisangehörigen Gemeinden und Städte keine Anpassungsbedarfe angezeigt. Das derzeit freie Budget „Sachsen“ in Höhe von 452,04 EUR wird in einem der nächsten Anpassungsverfahren ausgesteuert. Die Übersendung der bestätigten Investitionspläne des XV. Anpassungsverfahrens durch das SMEKUL steht zum Redaktionsschluss dieser Informationsvorlage noch aus.

#### **I. Umsetzungsstand landkreiseigener Einzelmaßnahmen (Datenstand: 5. Oktober 2022)<sup>3</sup>**

Mit der folgenden Tabelle soll zusammenfassend ein Überblick zu den bestätigten landkreiseigenen Vorhaben gegeben werden. Neben den Volumina an Gesamtkosten sowie den zur Verfügung stehenden Budgets ermöglicht die Übersicht darüber hinaus eine Aussage zu den bereits ausgezahlten Zuwendungshöhen sowie der Höhe der verwendungsnachweisgeprüften Ausgaben.

<sup>3</sup> Aufgrund laufender Anpassungsverfahren wurde der Datenstand zum 5. Oktober 2022 gewählt (Abschluss XIV. Anpassungsverfahren VwV Investkraft sowie V. Anpassungsverfahren VwV Invest Schule). Dies gewährleistet, dass die Vorlage von zwischenzeitlichen Änderungen unberührt bleibt.

**Tabelle 2: Umsetzungsstand landkreiseigener Einzelmaßnahmen**

Budget	Anzahl der bestätigten Einzelmaßnahmen im Investitionsplan	Gesamtkosten (in €)	Bewilligtes Budget/ Zuwendung (in €)	Bereits ausgezahlte Zuwendung (in €)	Bereits verwendungsnachweisgeprüft/ abgeschlossen	
					absolut (in €)	%
<b>Bund</b>	4	4.563.410,43	3.286.210,05	3.286.210,05	4.563.410,43	100,00
<b>Sachsen</b>	8	16.478.846,47	10.696.641,20	10.068.346,17	10.178.846,47	61,77
<b>Gesamt</b>	<b>12</b>	<b>21.042.256,90</b>	<b>13.982.851,25</b>	<b>13.354.556,22</b>	<b>14.742.256,90</b>	<b>70,06</b>

Eine detaillierte Darstellung zum Status der Realisierung je Einzelmaßnahme befindet sich in der beigefügten **Anlage 1**.

## II. Umsetzungsstand der Einzelmaßnahmen von kreisangehörigen Kommunen und nicht-kommunalen Dritten (Datenstand: 5. Oktober 2022)

Analog der Tabelle 2 stellt nachfolgende Übersicht den Sachverhalt für die Einzelmaßnahmen kreisangehöriger Kommunen und nicht-kommunaler Dritter dar.

**Tabelle 3: Umsetzungsstand der Einzelmaßnahmen kreisangehöriger Kommunen und nicht-kommunaler Dritter**

Budget	Anzahl der bestätigten Einzelmaßnahmen im Investitionsplan	Gesamtkosten (in €)	Bewilligtes Budget/ Zuwendung (in €)	Bereits ausgezahlte Zuwendung (in €)	Bereits verwendungsnachweisgeprüft/ abgeschlossen	
					absolut (in €)	%
<b>Bund</b>	54	10.945.158,61	6.070.177,65	5.983.519,77	10.280.469,69	93,93
<b>Sachsen</b>	96	46.399.401,39	19.864.738,76	19.424.532,72	37.762.022,35	81,38
<b>Gesamt</b>	<b>150</b>	<b>57.344.560,00</b>	<b>25.934.916,41</b>	<b>25.408.052,49</b>	<b>48.042.492,04</b>	<b>83,78</b>

## III. Zusammenfassung und Ausblick – VwV Investkraft

Insgesamt wurde bereits eine Zuwendung in Höhe von 38.762.608,71 EUR ausgezahlt, 150 der 162 Einzelmaßnahmen sind abgeschlossen bzw. verwendungsnachweisgeprüft. Das entspricht einer Abschlussquote von 93 %. Wertmäßig wurden bereits ca. 80 % der Gesamtkosten verwendungsnachweisgeprüft.

Die beigefügte **Anlage 2** gibt einen Gesamtüberblick zum aktuellen Stand der Bearbeitung aller Maßnahmen sowohl im Budgetteil „Bund“ als auch im Budgetteil „Sachsen“.

Der derzeitige rechnerische Mehrbedarf für die noch nicht abgeschlossenen Einzelmaßnahmen, welcher aufgrund fehlender Deckungsmöglichkeiten nicht bestätigt werden konnte, kann auf rund 1,1 Mio. EUR beziffert werden. Der Mehrbedarf gibt die notwendige Zuwendungshöhe über dem zur Verfügung stehenden Budget an. Allerdings wird hier weiterhin von einer gewissen Dynamik ausgegangen, da noch nicht zu allen Einzelmaßnahmen eine Kostensicherheit vorliegt.

Angesichts dieser Prognose ist nach dem aktuell vorliegenden Stand ein hundertprozentiger Abruf des zur Verfügung stehenden Budgets anzunehmen.

## B. Brücken in die Zukunft – VwV Invest Schule (Teil II)

Mit dem Ziel der Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemein- und berufsbildender Schulen wurde der Fonds Brücken in die Zukunft im Jahr 2018 um die VwV Invest Schule erweitert. Dabei unterstützt der Bund die Länder bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Kommunen und gewährt aus dem Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ Finanzhilfen von insgesamt 3,5 Mrd. EUR für Investitionen nach Artikel 104c des Grundgesetzes. Auf das Land Sachsen entfallen rund 177,9 Mio. EUR<sup>4</sup>, auf den Landkreis Zwickau anteilig ca. 15,9 Mio. EUR. Die Förderquote des Bundes beträgt 90 Prozent, die Beteiligung der Länder, einschließlich der Kommunen, liegt bei mindestens 10 Prozent. 30 Prozent der insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel dienen der Realisierung landkreiseigener Projekte, 70 Prozent für Einzelmaßnahmen kreisangehöriger Gemeinden und Städte (inkl. angemessene Berücksichtigung freier Träger).

Im vorgeschalteten Maßnahmeplanverfahren – zum eigentlichen Antrags- und Bewilligungsverfahren – wurden insgesamt 50 Einzelmaßnahmen (inkl. Ersatzmaßnahmen) eingereicht und durch die Landkreisverwaltung auf Plausibilität (z. B. Wahl des Fördergegenstandes und Schlüssigkeit der Gesamtfinanzierung) geprüft. Von den 50 Einzelmaßnahmen wurden 44 Einzelmaßnahmen in den Investitionsplan aufgenommen.

Die Anpassungsverfahren sollen zweimal jährlich durchgeführt werden und sich in quartalsweisem Turnus mit dem ersten Teil (VwV Investkraft) abwechseln. Der Durchführungszeitraum endet am 31. Dezember 2023.<sup>5</sup>

Unter Berücksichtigung der bisher realisierten Anpassungsverfahren stellt sich die Situation wie folgt dar:

**Tabelle 4: Übersicht VwV Invest Schule**

	<b>VwV Invest Schule (in €)</b>		
Gesamtbudget	<b>15.866.959,00</b>		
darunter Reserve	<b>1.586.696,00</b>		
Zur Aufteilung verfügbares Budget	<b>14.280.263,00</b>		
davon Landkreis (30%)	<b>4.284.078,90</b>		
davon Kommunen (70%)	<b>9.996.184,10</b>		
<b>Stand Investitionsplan vom:</b>	<b>Untersetztes Budget (€)</b>	<b>Darunter in Anspruch genommene Reserve (€)</b>	<b>Anzahl Maßnahmen</b>
29. Juli 2019 (I. Anpassungsverfahren)	14.267.169,55	18.906,55	44
11. Februar 2020 (II. Anpassungsverfahren)	14.303.682,75	23.419,75	46
17. Dezember 2020 (III. Anpassungsverfahren)	14.251.224,19	181.508,26	45
13. Oktober 2021 (IV. Anpassungsverfahren)	14.455.166,12	266.615,23	45

<sup>4</sup> Vgl. §§ 10, 11 KInvFGII.

<sup>5</sup> Vgl. Ziffer IV Nr. 4 VwV Invest Schule.

	VwV Invest Schule (in €)		
Gesamtbudget	15.866.959,00		
darunter Reserve	1.586.696,00		
Zur Aufteilung verfügbares Budget	14.280.263,00		
davon Landkreis (30%)	4.284.078,90		
davon Kommunen (70%)	9.996.184,10		
<b>Stand Investitionsplan vom:</b>	<b>Untersetztes Budget (€)</b>	<b>Darunter in Anspruch genommene Reserve (€)</b>	<b>Anzahl Maßnahmen</b>
4. August 2022 (V. Anpassungsverfahren)	14.722.054,69	585.123,83	45

Im Hinblick auf das VI. Anpassungsverfahren, dessen Beginn noch nicht bekanntgegeben wurde, ist abzusehen, dass es wieder sowohl finanzielle als auch inhaltliche Änderungsbedarfe geben wird. Des Weiteren werden in den kommenden Anpassungsverfahren das derzeit freie Budget in Höhe von 143.332,14 EUR untersetzt sowie weitere noch vorhandene Reservebudgets der kreisangehörigen Gemeinden und Städte abgerufen.

#### I. Umsetzungsstand landkreiseigener Einzelmaßnahmen (Datenstand: 5. Oktober 2022)

Die folgende Tabelle gibt zusammenfassend einen Überblick über die Gesamtkosten, das zur Verfügung stehende Budget der bestätigten landkreiseigenen Vorhaben sowie die bereits ausgezahlten Zuwendungshöhen durch die SAB. Nach derzeitigem Stand wurde bereits eine der vier Einzelmaßnahmen abgeschlossen.

**Tabelle 5: Umsetzungsstand landkreiseigener Einzelmaßnahmen**

Anzahl der bestätigten Einzelmaßnahmen im Investitionsplan	Gesamtkosten (in €)	Beantragtes Budget/ Zuwendung (in €)	Bewilligtes Budget/ Zuwendung (in €)	Bereits ausgezahlte Zuwendung (in €)	Bereits verwendungsnachweisgeprüft/ abgeschlossen	
					absolut (in €)	%
4	5.687.850,92	4.265.211,57	4.265.211,57	2.195.792,00	515.745,72	9,07

Eine detaillierte Darstellung zum Status der Realisierung je Einzelmaßnahme befindet sich in der beigefügten **Anlage 3**.

## II. Umsetzungsstand der Einzelmaßnahmen von kreisangehörigen Kommunen und nicht-kommunalen Dritten (Datenstand: 5. Oktober 2022)

Analog der Tabelle 5 stellt nachfolgende Übersicht den Sachverhalt für die Einzelmaßnahmen kreisangehöriger Kommunen und nicht-kommunaler Dritter dar.

**Tabelle 6: Umsetzungsstand der Einzelmaßnahmen kreisangehöriger Kommunen und nicht-kommunaler Dritter**

Anzahl der bestätigten Einzelmaßnahmen im Investitionsplan	Gesamtkosten (in €)	Beantragtes Budget/ Zuwendung (in €)	Bewilligtes Budget/ Zuwendung (in €)	Bereits ausgezahlte Zuwendung (in €)	Bereits verwendungsnachweisgeprüft/ abgeschlossen	
					absolut (in €)	%
41	20.279.963,52	10.456.843,12	10.456.843,12	6.012.228,39	6.947.711,16	34,26

## III. Zusammenfassung und Ausblick – VwV Invest Schule

Die insgesamt beantragten Zuwendungen i. H. v. 14.722.054,69 EUR wurden bereits in vollem Umfang bewilligt und davon ca. 56 % ausgezahlt. 25 der 45 Einzelmaßnahmen sind abgeschlossen bzw. verwendungsnachweisgeprüft, was einer Abschlussquote von 56 % entspricht. Wertmäßig wurden bisher ca. 29 % der Gesamtkosten verwendungsnachweisgeprüft.

Die beigefügte **Anlage 4** gibt einen Gesamtüberblick zum aktuellen Stand der Bearbeitung aller Einzelmaßnahmen.



Innerhalb der ersten fünf Anpassungsverfahren wurden bereits Mehrbedarfe aufgrund erhöhter Ausschreibungsergebnisse bzw. auf Grund unvorhersehbarer, zwingend notwendiger, zusätzlicher Leistungen beim Landkreis gemeldet, welche teilweise durch das Reservebudget abgedeckt werden konnten. Auch für das bevorstehende sechste Anpassungsverfahren wurden im Vorfeld Mehrbedarfe angekündigt, sodass von einem kontinuierlichen Abruf der Reserve ausgegangen wird.

## Anlage 1: VwV Investkraft - Landkreiseigene Maßnahmen - Status der Realisierung je Einzelmaßnahme (Stand: 5. Oktober 2022)

Bezeichnung der Einzelmaßnahme	ID	Budgetteil	Gesamtkosten (in €)	bereits bewilligte Zuwendung (in €)	Baubeginn	Aktueller Status	Bemerkung	Bauende
Gymnasium Wilkau-Haßlau - energetische Sanierung 1. BA	454	Bund	2.766.013,16	1.953.372,92	03.07.2017	WVN-geprüft/VN-geprüft	fertiggestellt	Dezember 2019
BSZ Werdau - energetische Sanierung Sporthalle	456	Bund	1.185.320,80	886.210,05	19.06.2017	WVN-geprüft/VN-geprüft	fertiggestellt	August 2018
BSZ August Horch - energetische Sanierung (Dach)	1902	Bund	498.381,87	371.627,08	17.03.2018	WVN-geprüft/VN-geprüft	fertiggestellt	Dezember 2017
BSZ für Bau- und Oberflächentechnik (Außenstelle Limbach-Oberfrohn - Ausbildungshalle Bautechnik) - energetische Sanierung (Dach)	1908	Bund	113.694,60	75.000,00	07.08.2017	WVN-geprüft/VN-geprüft	fertiggestellt	Dezember 2017
Verwaltungsgebäude Glauchau, G.-Hauptmann-Weg 1, Haus 2 - Sanierung	458	Sachsen	3.086.008,15	1.950.000,00	24.11.2016	WVN-geprüft/VN-geprüft	fertiggestellt	Januar 2019
Verwaltungsgebäude Werdau, Zum Sternplatz 7 - Sanierung	460	Sachsen	6.300.000,00	3.973.951,89	19.08.2019	Bewilligt	in Fertigstellung zum Bezug	Ende 2022
L-Schule Hohenstein-Ernstthal - Brandschutz	462	Sachsen	514.138,15	375.000,00	26.06.2017	WVN-geprüft/VN-geprüft	fertiggestellt	November 2019
G-Schule Werdau - Stützmauer und Außenanlagen	463	Sachsen	377.854,71	282.515,45	02.05.2017	WVN-geprüft/VN-geprüft	fertiggestellt	Dezember 2017
G-Schule Meerane - Trockenlegung	465	Sachsen	331.138,91	247.715,81	26.06.2017	WVN-geprüft/VN-geprüft	fertiggestellt	September 2017
Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain - denkmalgerechte Sanierung zur öffentlichen Nutzung des Schlossgebäudes	513	Sachsen	1.997.135,60	1.495.816,85	14.10.2019	WVN-geprüft/VN-geprüft	fertiggestellt	Juni 2020
Schloss Waldenburg - denkmalgerechte Sanierung Wandelgang für öffentliche Nutzung	514	Sachsen	163.334,79	112.500,00	24.01.2017	WVN-geprüft/VN-geprüft	fertiggestellt	Oktober 2017
Gymnasium Wilkau-Haßlau - Neubau Zwei-Feldsporthalle	3860	Sachsen	3.709.236,16	2.259.141,20	02.07.2018	WVN-geprüft/VN-geprüft	fertiggestellt	März 2020
		<b>Bund</b>	<b>4.563.410,43</b>	<b>3.286.210,05</b>				
		<b>Sachsen</b>	<b>16.478.846,47</b>	<b>10.696.641,20</b>				
		<b>Gesamt</b>	<b>21.042.256,90</b>	<b>13.982.851,25</b>				

**Anlage 2: Bearbeitungsstand VwV Investkraft - Budget Bund und Budget Sachsen (Stand: 5. Oktober 2022)**

VwV Investkraft - Teil I				
Anzahl Maßnahmen	162	davon beantragt und noch nicht bewilligt	davon bewilligt und noch nicht abgeschlossen	davon abgeschlossen/verwendungsnachweisgeprüft
Budget Bund	58	0	2	56
<i>davon landkreiseigene Maßnahmen</i>	4	0	0	4
<i>davon Maßnahmen kreisangehöriger Städte und Gemeinden</i>	54	0	2	52
Budget Sachsen	104	0	10	94
<i>davon landkreiseigene Maßnahmen</i>	8	0	1	7
<i>davon Maßnahmen kreisangehöriger Städte und Gemeinden</i>	96	0	9	87

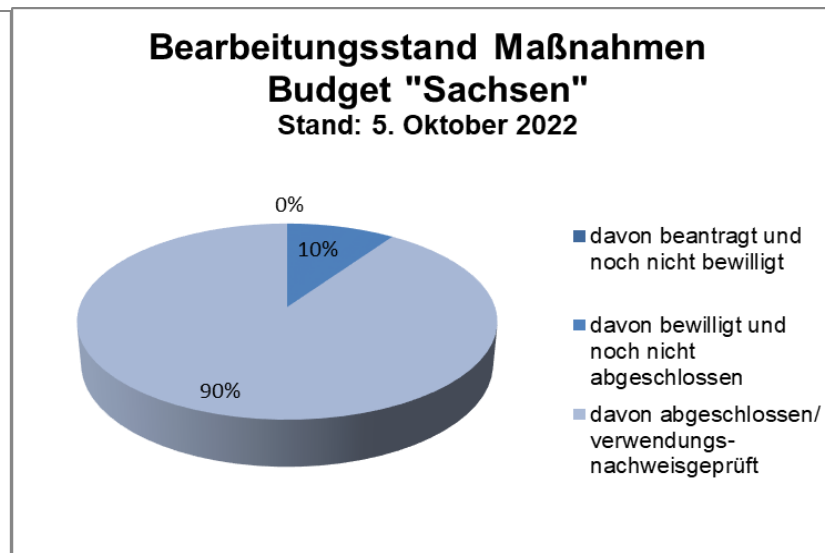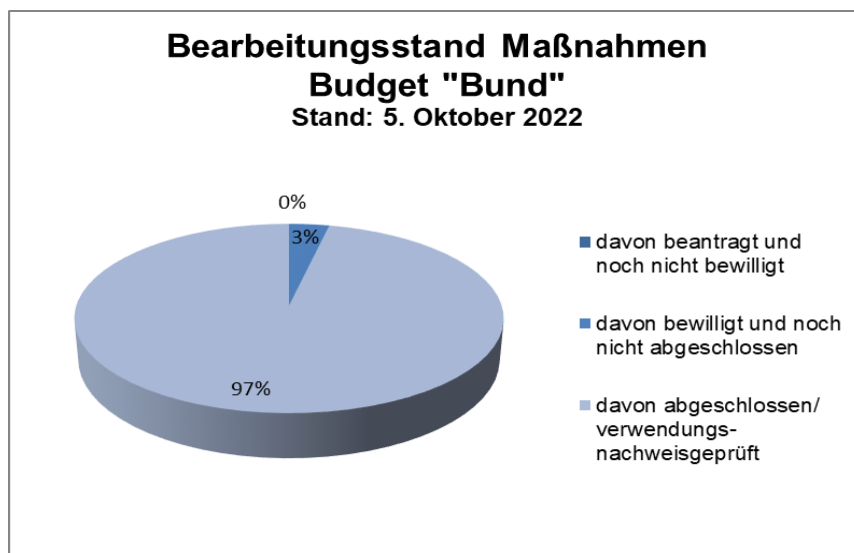

### Anlage 3: VwV Invest Schule - Landkreiseigene Maßnahmen - Status der Realisierung je Einzelmaßnahme (Stand: 5. Oktober 2022)

Bezeichnung der Einzelmaßnahme	ID	Gesamtkosten	beantragte Zuwendung	bewilligte Zuwendung	Baubeginn	Aktueller Status	Bemerkung	Bauende
Gymnasium Kirchberg - Investkraft Schulinfra (Teil 2)	305	1.260.000,00	945.000,00	945.000,00	Anfang Sommerferien 2021	Erstbewilligt	Baumaßnahmen in Arbeit	Ende 2023
Gymnasium Wilkau-Haßlau - Investkraft Schulinfra (Teil 2) - Alt- und Neubau (3.BA)	306	2.112.105,20	1.584.078,90	1.584.078,90	Anfang Sommerferien 2020	bewilligt	Baumaßnahmen in Arbeit	Sommerferien 2023
BSZ Lichtenstein - Investkraft Schulinfra (Teil 2)	307	1.800.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	Anfang Sommerferien 2020	bewilligt	Baumaßnahmen in Arbeit	Ende 2022
BSZ für Bau- und Oberflächentechnik Außenstelle Limbach-Oberfrohna - Investkraft Schulinfra (Teil 2)	308	515.745,72	386.132,67	386.132,67	Anfang Sommerferien 2020	VWN-geprüft/VN-geprüft	fertiggestellt	Ende Herbstferien 2021
<b>Gesamt</b>		<b>5.687.850,92€</b>	<b>4.265.211,57€</b>	<b>4.265.211,57€</b>				

#### Anlage 4: Bearbeitungsstand VwV Invest Schule (Stand: 5. Oktober 2022)

VwV Invest Schule - Teil II				
Anzahl Maßnahmen		davon beantragt (aber noch nicht bewilligt)	davon bewilligt und noch nicht abgeschlossen	davon abgeschlossen/ Verwendungs- nachweisgeprüft
Gesamt	45	0	20	25
davon landkreiseigene Maßnahmen	4	0	3	1
davon Maßnahmen kreisangehöriger Städte und Gemeinden	41	0	17	24

