



LANDKREIS
ZWICKAU

MOTOR SÄCHSISCHER WIRTSCHAFT

Dezernat Finanzen und Service

Förderprogramm

„Brücken in die Zukunft“

**Abschlussbericht: VwV Investkraft (Teil I)
und VwV Invest Schule (Teil II) -
im Landkreis Zwickau**

InfoV/180/2025

A. Brücken in die Zukunft - VwV Investkraft (Teil I)

Mit dem im Jahre 2016 initiierten Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“ stehen dem Freistaat Sachsen ca. 800 Mio. EUR für Investitionen und die energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur, dem Bau und Ausbau von Kindertagesstätten oder dem Straßenbau zur Verfügung. Das Budget stammt aus Bundes-, Landes- und FAG-Mitteln der Kommunen und wird den Landkreisen, Städten und Gemeinden in drei Blöcken zur Verfügung gestellt: der Investitionspauschale (zum Einsatz eigener Investitionen oder der Kofinanzierung geförderter Projekte) sowie dem Budget „Bund“ und dem Budget „Sachsen“, welche in der VwV Investkraft kodifiziert sind. Für Letztere entfallen auf den Landkreis Zwickau anteilig ca. 40 Mio. EUR. Diese werden als nicht rückzahlbarer Zuschuss i. H. v. bis zu 75 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gewährt.¹ 35 Prozent der insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel dienen der Realisierung landkreiseigener Projekte, 65 Prozent für Einzelmaßnahmen kreisangehöriger Gemeinden und Städte.

Innerhalb des dem eigentlichen Antrags- und Bewilligungsverfahren vorgeschalteten Maßnahmenplanverfahrens wurden insgesamt 264 Einzelmaßnahmen (inkl. Ersatzmaßnahmen) eingereicht und durch die Landkreisverwaltung auf Plausibilität (z. B. Wahl des Fördergegenstandes und Schlüssigkeit der Gesamtfinanzierung) geprüft. Von den 264 Einzelmaßnahmen wurden 163 Einzelmaßnahmen in den Investitionsplan aufgenommen.

Es wurde sich verständigt, das Anpassungsverfahren zweimal jährlich durchzuführen, um den Mittelabfluss und damit auch die Budgetinanspruchnahme bis zum Ende der Bewilligungszeiträume (Budget „Bund“: 31. Dezember 2021; Budget „Sachsen“: 31. Dezember 2023, in begründeten Ausnahmefällen: 31. Dezember 2025)² garantieren zu können.

Unter Berücksichtigung der bisher realisierten Anpassungsverfahren stellt sich die Situation chronologisch wie folgt dar:

Tabelle 1: VwV Investkraft – Chronologischer Ablauf

	Budget „Bund“		Budget „Sachsen“	
Verfügbares Budget (in €)	9.390.734,00		30.561.832,00	
Stand Investitionsplan vom:	Untersetztes Budget (in €)	Anzahl Maßnahmen	Untersetztes Budget (in €)	Anzahl Maßnahmen
14. Juni 2016 (Originärer Maßnahmenplan)	9.390.734,00	57	30.561.832,00	106
15. Mai 2017 (I. Anpassungsverfahren)	9.390.734,00	57	30.561.832,00	104
23. November 2017 (II. Anpassungsverfahren)	9.390.734,00	55	30.533.457,00	102
4. Mai 2018 (III. Anpassungsverfahren)	9.390.734,00	55	30.561.136,98	102
21. Dezember 2018 (IV. Anpassungsverfahren)	9.349.638,41	54	30.511.814,66	102
18. April 2019 (V. Anpassungsverfahren)	9.388.043,29	55	30.561.832,00	103
4. September 2019 (VI. Anpassungsverfahren)	9.387.873,85	55	30.390.823,22	102
10. Dezember 2019 (VII. Anpassungsverfahren)	9.387.639,08	55	30.537.898,29	102

¹ Vgl. Großbuchstabe B Ziffer IV Nr. 3 VwV Investkraft bzw. Großbuchstabe C Ziffer IV Nr. 3 VwV Investkraft

² Vgl. Großbuchstabe B Ziffer III Nr. 1 Kleinbuchstabe e VwV Investkraft bzw. Großbuchstabe C Ziffer III Nr. 1 Kleinbuchstabe b VwV Investkraft

	Budget „Bund“		Budget „Sachsen“	
Verfügbares Budget (in €)	9.390.734,00		30.561.832,00	
Stand Investitionsplan vom:	Untersetztes Budget (in €)	Anzahl Maßnahmen	Untersetztes Budget (in €)	Anzahl Maßnahmen
9. April 2020 (VIII. Anpassungsverfahren)	9.390.734,00	56	30.542.427,63	103
18. August 2020 (IX. Anpassungsverfahren)	9.390.734,00	56	30.561.831,99	104
8. Dezember 2020 (X. Anpassungsverfahren)	9.301.231,40	55	30.561.832,00	104
20. April 2021 (XI. Anpassungsverfahren)	9.390.734,00	58	30.561.832,00	104
6. September 2021 (XII. Anpassungsverfahren)	9.390.392,21	58	30.561.832,00	104
8. Dezember 2021 (XIII. Anpassungsverfahren)	9.390.392,21	58	30.561.832,00	104
31. August 2022 (XIV. Anpassungsverfahren)	9.390.734,00	58	30.561.379,96	104
24. November 2022 (XV. Anpassungsverfahren)	9.390.734,00	58	30.561.379,96	104
12. Oktober 2023 (XVI. Anpassungsverfahren)	9.390.734,00	58	30.561.379,96	104
15. August 2024 (XVII. Anpassungsverfahren)	9.390.734,00	58	30.561.379,96	104
10. Juni 2025 (XVIII. Anpassungsverfahren)	9.390.734,00	58	30.561.832,00	104
22. September 2025 (XIX. Anpassungsverfahren)	9.390.734,00	58	30.561.832,00	104

Die Umsetzung des Budgetteils „Bund“ im Programm „Brücken in die Zukunft“ ist im Freistaat Sachsen abgeschlossen. Die dem Landkreis Zwickau zur Verfügung gestellten Mittel wurden vollumfänglich in Anspruch genommen und alle Einzelmaßnahmen fristgerecht abgeschlossen und abgerechnet.

Im Budgetteil „Sachsen“ im Programm „Brücken in die Zukunft“ konnte der Landkreis Zwickau im XVIII. Anpassungsverfahren ebenfalls das gesamte zur Verfügung stehende Budget vollumfänglich untersetzen. Aus diesem Grund hat der Landkreis Zwickau das am 12. September 2025 eröffnete XIX. Überprüfungsverfahren gegenüber seinen kreisangehörigen Kommunen nicht eröffnet.

I. Umsetzungsstand landkreiseigener Einzelmaßnahmen (Datenstand: 22. September 2025)³

Mit der folgenden Tabelle soll zusammenfassend ein Überblick zu den bestätigten landkreiseigenen Vorhaben gegeben werden. Neben den Volumina an Gesamtkosten sowie den zur Verfügung stehenden Budgets ermöglicht die Übersicht darüber hinaus eine Aussage zu den bereits ausgezahlten Zuwendungshöhen sowie der Höhe der verwendungsnachweisgeprüften Ausgaben. Daraus wird ersichtlich, dass bereits alle eigenen Einzelmaßnahmen des Landkreises abgeschlossen/die Verwendungsnachweise geprüft worden sind.

³ Es wurde der Datenstand zum 22. September 2025 gewählt (Abschluss XVIII. Anpassungsverfahren VwV Investkraft sowie VII. Anpassungsverfahren VwV Invest Schule).

Tabelle 2: Umsetzungsstand landkreiseigener Einzelmaßnahmen

Budget	Anzahl der bestätigten Einzelmaßnahmen im Investitionsplan	Gesamtkosten (in €)	Bewilligtes Budget/ Zuwendung (in €)	Bereits ausgezahlte Zuwendung (in €)	Bereits verwendungsnachweisgeprüft/ abgeschlossen	
					absolut (in €)	%
Bund	4	4.563.410,43	3.286.210,05	3.286.210,05	4.563.410,43	100,00
Sachsen	8	16.784.988,86	10.696.641,20	10.696.641,20	16.784.988,86	100,00
Gesamt	12	21.348.399,29	13.982.851,25	13.982.851,25	21.348.399,29	100,00

Eine detaillierte Darstellung je Einzelmaßnahme befindet sich in der beigelegten **Anlage 1**.

II. Umsetzungsstand der Einzelmaßnahmen von kreisangehörigen Kommunen und nicht-kommunalen Dritten (Datenstand: 22. September 2025)

Analog der Tabelle 2 stellt nachfolgende Übersicht den Sachverhalt für die Einzelmaßnahmen kreisangehöriger Kommunen und nicht-kommunaler Dritter dar.

Tabelle 3: Umsetzungsstand der Einzelmaßnahmen kreisangehöriger Kommunen und nicht-kommunaler Dritter

Budget	Anzahl der bestätigten Einzelmaßnahmen im Investitionsplan	Gesamtkosten (in €)	Bewilligtes Budget/ Zuwendung (in €)	Bereits ausgezahlte Zuwendung (in €)	Bereits verwendungsnachweisgeprüft/ abgeschlossen	
					absolut (in €)	%
Bund	54	11.051.961,51	6.104.523,95	6.104.523,95	11.051.961,51	100,00
Sachsen	96	46.918.293,85	19.865.190,80	19.810.329,33	40.912.788,85	87,20
Gesamt	150	57.970.255,36	25.969.714,75	25.914.853,28	51.964.750,36	89,64

III. Zusammenfassung und Ausblick – VwV Investkraft

Insgesamt wurde eine Zuwendung in Höhe von 39.897.704,53 EUR ausgezahlt, 161 der 162 Einzelmaßnahmen sind abgeschlossen bzw. verwendungsnachweisgeprüft. Das entspricht einer Abschlussquote von 99 %. Bei lediglich einer Maßnahme ist die Prüfung des Verwendungsnachweises noch nicht abgeschlossen (Grund: Drittmittelfinanzierung).

Die beigelegte **Anlage 2** gibt einen Gesamtüberblick zum aktuellen Stand der Bearbeitung aller Maßnahmen sowohl im Budgetteil „Bund“ als auch im Budgetteil „Sachsen“.

Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass die noch nicht abschließend verwendungsnachweisgeprüfte Maßnahme aufgrund sehr hoher Gesamtkosten nicht mit einem Minderbedarf abschließen wird, so dass ein hundertprozentiger Abruf des zur Verfügung stehenden Budgets anzunehmen ist. Somit ist die Umsetzung des Budgetteils „Sachsen“ ebenso abgeschlossen.

B. Brücken in die Zukunft – VwV Invest Schule (Teil II)

Mit dem Ziel der Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemein- und berufsbildender Schulen wurde der Fond Brücken in die Zukunft im Jahr 2018 um die VwV Invest Schule erweitert. Dabei unterstützt der Bund die Länder bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Kommunen und gewährt aus dem Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ Finanzhilfen von insgesamt 3,5 Mrd. EUR für Investitionen nach Artikel 104c des Grundgesetzes. Auf das Land Sachsen entfallen rund 177,9 Mio. EUR⁴, auf den Landkreis Zwickau anteilig ca. 15,9 Mio. EUR. Die Förderquote des Bundes beträgt 90 Prozent, die Beteiligung der Länder, einschließlich der Kommunen, liegt bei mindestens 10 Prozent. 30 Prozent der insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel dienen der Realisierung landkreiseigener Projekte, 70 Prozent für Einzelmaßnahmen kreisangehöriger Gemeinden und Städte (inkl. angemessene Berücksichtigung freier Träger).

Im vorgeschalteten Maßnahmeplanverfahren – zum eigentlichen Antrags- und Bewilligungsverfahren – wurden insgesamt 50 Einzelmaßnahmen (inkl. Ersatzmaßnahmen) eingereicht und durch die Landkreisverwaltung auf Plausibilität (z. B. Wahl des Fördergegenstandes und Schlüssigkeit der Gesamtfinanzierung) geprüft. Von den 50 Einzelmaßnahmen wurden 44 Einzelmaßnahmen in den Investitionsplan aufgenommen.

Die Anpassungsverfahren sollen zweimal jährlich durchgeführt werden und sich in quartalsweisem Turnus mit dem ersten Teil (VwV Investkraft) abwechseln. Der Durchführungszeitraum endet am 31. Dezember 2024.⁵

Unter Berücksichtigung der bisher realisierten Anpassungsverfahren stellt sich die Situation wie folgt dar:

Tabelle 4: Übersicht VwV Invest Schule

	VwV Invest Schule (in €)		
Gesamtbudget	15.866.959,00		
darunter Reserve	1.586.696,00		
zur Aufteilung verfügbares Budget	14.280.263,00		
davon Landkreis (30%)	4.284.078,90		
davon Kommunen (70%)	9.996.184,10		
Stand Investitionsplan vom:	Untersetztes Budget (€)	Darunter in Anspruch genommene Reserve (€)	Anzahl Maßnahmen
29. Juli 2019 (I. Anpassungsverfahren)	14.267.169,55	18.906,55	44
11. Februar 2020 (II. Anpassungsverfahren)	14.303.682,75	23.419,75	46
17. Dezember 2020 (III. Anpassungsverfahren)	14.251.224,19	181.508,26	45
13. Oktober 2021 (IV. Anpassungsverfahren)	14.455.166,12	266.615,23	45
4. August 2022 (V. Anpassungsverfahren)	14.722.054,69	585.123,83	45

⁴ Vgl. §§ 10, 11 KInvFGII.

⁵ Vgl. Ziffer IV Nr. 4 VwV Invest Schule.

	VwV Invest Schule (in €)		
Gesamtbudget	15.866.959,00		
darunter Reserve	1.586.696,00		
Zur Aufteilung verfügbares Budget	14.280.263,00		
davon Landkreis (30%)	4.284.078,90		
davon Kommunen (70%)	9.996.184,10		
Stand Investitionsplan vom:	Untersetztes Budget (€)	Darunter in Anspruch genommene Reserve (€)	Anzahl Maßnahmen
16. März 2023 (VI. Anpassungsverfahren)	15.667.480,88	1.387.217,88	48
19. Juli 2024 (VII. Anpassungsverfahren)	15.866.959,00	1.586.696,00	48
Frühjahr 2025 (VIII. Anpassungsverfahren) ohne Beteiligung Landkreis Zwickau	15.866.959,00	1.586.696,00	48

Im VII. Anpassungsverfahren konnte, nach Abruf und Freigabe aller noch verfügbaren Reservemittel, das gesamte dem Landkreis Zwickau zur Verfügung stehende Budget vollumfänglich untersetzt werden.

Im Mai 2025 wurde dem Landkreis Zwickau durch die Sächsische Aufbaubank (SAB) mitgeteilt, dass ein weiteres VIII. Anpassungsverfahren durchgeführt wurde, an welchem der Landkreis Zwickau, aufgrund der bereits erfolgten vollumfänglichen Untersetzung des zur Verfügung stehenden Budgets, nicht beteiligt wurde. Daraufhin wurden die restlichen 5 Gemeinden/Städte – die bis zu diesem Zeitpunkt den Verwendungsnachweis noch nicht abschließend eingereicht hatten – aufgefordert, dies vorzunehmen.

I. Umsetzungsstand landkreiseigener Einzelmaßnahmen (Datenstand: 22. September 2025)

Die folgende Tabelle gibt zusammenfassend einen Überblick über die Gesamtkosten, das zur Verfügung stehende Budget der bestätigten landkreiseigenen Vorhaben sowie die bereits ausgezahlten Zuwendungshöhen durch die SAB. Daraus wird ersichtlich, dass bereits alle eigenen Einzelmaßnahmen des Landkreises abgeschlossen/die Verwendungsnachweise geprüft worden sind.

Tabelle 5: Umsetzungsstand landkreiseigener Einzelmaßnahmen

Anzahl der bestätigten Einzelmaßnahmen im Investitionsplan	Gesamtkosten (in €)	Beantragtes Budget/ Zuwendung (in €)	Bewilligtes Budget/ Zuwendung (in €)	Bereits ausgezahlte Zuwendung (in €)	Bereits verwendungsnachweisgeprüft/ abgeschlossen	
					absolut (in €)	%
4	7.523.255,88€	4.760.087,70	4.760.087,70	4.760.087,70	7.523.255,88	100,00

Eine detaillierte Darstellung zum Status der Realisierung je Einzelmaßnahme befindet sich in der beigefügten **Anlage 3**.

II. Umsetzungsstand der Einzelmaßnahmen von kreisangehörigen Kommunen und nicht-kommunalen Dritten (Datenstand: 22. September 2025)

Analog der Tabelle 5 stellt nachfolgende Übersicht den Sachverhalt für die Einzelmaßnahmen kreisangehöriger Kommunen und nicht-kommunaler Dritter dar.

Tabelle 6: Umsetzungsstand der Einzelmaßnahmen kreisangehöriger Kommunen und nicht-kommunaler Dritter

Anzahl der bestätigten Einzelmaßnahmen im Investitionsplan	Gesamtkosten (in €)	Beantragtes Budget/ Zuwendung (in €)	Bewilligtes Budget/ Zuwendung (in €)	Bereits ausgezahlte Zuwendung (in €)	Bereits verwendungsnachweisgeprüft/ abgeschlossen	
					absolut (in €)	%
44	24.021.042,44	11.106.871,30	11.106.871,30	10.985.053,16	22.704.834,79	94,52

III. Zusammenfassung und Ausblick – VwV Invest Schule

Das gesamte dem Landkreis Zwickau zur Verfügung stehende Budget i. H. v. 15.866.959,00 EUR wurde bereits in vollem Umfang bewilligt und davon ca. 99 % ausgezahlt. 46 der 48 Einzelmaßnahmen sind abgeschlossen bzw. verwendungsnachweisgeprüft, was einer Abschlussquote von ca. 96 % entspricht. Wertmäßig wurden bisher ca. 96 % der Gesamtkosten verwendungsnachweisgeprüft.

Die beigefügte **Anlage 4** gibt einen Gesamtüberblick zum aktuellen Stand der Bearbeitung aller Einzelmaßnahmen.

Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass die beiden Maßnahmen, welche derzeit noch nicht abschließend verwendungsnachweisgeprüft wurden, aufgrund der höheren Gesamtkosten nicht mit Minderbedarf abschließen, so dass von einer vollumfänglichen Budgetinanspruchnahme ausgegangen werden kann.

Das Verfahren VwV Invest Schule ist grundsätzlich abgeschlossen.

Anlage 1: VwV Investkraft - Landkreiseigene Maßnahmen - Status der Realisierung je Einzelmaßnahme (Stand: 22. September 2025)

Bezeichnung der Einzelmaßnahme	ID	Budgetteil	Gesamtkosten (in €)	bereits bewilligte Zuwendung (in €)	Baubeginn	Aktueller Status	Bemerkung	Bauende
Gymnasium Wilkau-Haßlau - energetische Sanierung 1. BA	454	Bund	2.766.013,16	1.953.372,92	03.07.2017	VWN-geprüft/VN-geprüft	fertiggestellt	Dezember 2019
BSZ Werdau - energetische Sanierung Sporthalle	456	Bund	1.185.320,80	886.210,05	19.06.2017	VWN-geprüft/VN-geprüft	fertiggestellt	August 2018
BSZ August Horch - energetische Sanierung (Dach)	1902	Bund	498.381,87	371.627,08	17.03.2018	VWN-geprüft/VN-geprüft	fertiggestellt	Dezember 2017
BSZ für Bau- und Oberflächentechnik (Außenstelle Limbach-Oberfrohna - Ausbildungshalle Bautechnik) - energetische Sanierung (Dach)	1908	Bund	113.694,60	75.000,00	07.08.2017	VWN-geprüft/VN-geprüft	fertiggestellt	Dezember 2017
Verwaltungsgebäude Glauchau, G.-Hauptmann-Weg 1, Haus 2 - Sanierung	458	Sachsen	3.086.008,15	1.950.000,00	24.11.2016	VWN-geprüft/VN-geprüft	fertiggestellt	Januar 2019
Verwaltungsgebäude Werdau, Zum Sternplatz 7 - Sanierung	460	Sachsen	6.606.142,39	3.973.951,89	19.08.2019	VWN-geprüft/VN-geprüft	fertiggestellt	Dezember 2022
L-Schule Hohenstein-Ernstthal - Brandschutz	462	Sachsen	514.138,15	375.000,00	26.06.2017	VWN-geprüft/VN-geprüft	fertiggestellt	November 2019
G-Schule Werdau - Stützmauer und Außenanlagen	463	Sachsen	377.854,71	282.515,45	02.05.2017	VWN-geprüft/VN-geprüft	fertiggestellt	Dezember 2017
G-Schule Meerane - Trockenlegung	465	Sachsen	331.138,91	247.715,81	26.06.2017	VWN-geprüft/VN-geprüft	fertiggestellt	September 2017
Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain - denkmalgerechte Sanierung zur öffentlichen Nutzung des Schlossgebäudes	513	Sachsen	1.997.135,60	1.495.816,85	14.10.2019	VWN-geprüft/VN-geprüft	fertiggestellt	Juni 2020
Schloss Waldenburg - denkmalgerechte Sanierung Wandelgang für öffentliche Nutzung	514	Sachsen	163.334,79	112.500,00	24.01.2017	VWN-geprüft/VN-geprüft	fertiggestellt	Oktober 2017
Gymnasium Wilkau-Haßlau - Neubau Zwei-Feldsporthalle	3860	Sachsen	3.709.236,16	2.259.141,20	02.07.2018	VWN-geprüft/VN-geprüft	fertiggestellt	März 2020
Bund			4.563.410,43	3.286.210,05				
Sachsen			16.784.988,86	10.696.641,20				
Gesamt			21.348.399,29	13.982.851,25				


Anlage 2: Bearbeitungsstand VwV Investkraft - Budget Bund und Budget Sachsen (Stand: 22. September 2025)

VwV Investkraft - Teil I			
Anzahl Maßnahmen	162	davon bewilligt und noch nicht abgeschlossen	davon abgeschlossen/verwendungs-nachweisgeprüft
Budget Bund	58	0	58
davon landkreiseigene Maßnahmen	4	0	4
davon Maßnahmen kreisangehöriger Städte und Gemeinden	54	0	54
Budget Sachsen	104	1	103
davon landkreiseigene Maßnahmen	8	0	8
davon Maßnahmen kreisangehöriger Städte und Gemeinden	96	1	95

Bearbeitungsstand Maßnahmen

Budget "Bund"

Stand: 22. September 2025

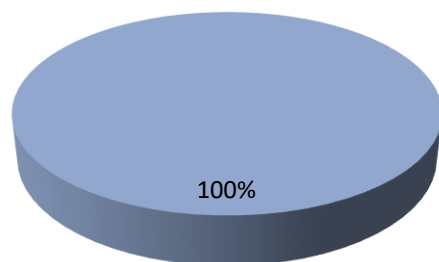


- davon bewilligt und noch nicht abgeschlossen
- davon abgeschlossen/verwendungs-nachweisgeprüft

Bearbeitungsstand Maßnahmen Budget

"Sachsen"

Stand: 22. September 2025



- davon bewilligt und noch nicht abgeschlossen
- davon abgeschlossen/verwendungs-nachweisgeprüft

Anlage 3: VwV Invest Schule - Landkreiseigene Maßnahmen - Status der Realisierung je Einzelmaßnahme (Stand: 22. September 2025)

Bezeichnung der Einzelmaßnahme	ID	Gesamtkosten in €	beantragte Zuwendung in €	bewilligte Zuwendung in €	Baubeginn	Aktueller Status	Bemerkung	Bauende
Gymnasium Kirchberg - Investkraft Schulinfra (Teil 2)	305	2.179.692,47	1.049.999,70	1.049.999,70	Anfang Sommerferien 2021	VWN-geprüft/VN-geprüft	fertiggestellt	Ende 2024
Gymnasium Wilkau-Haßlau - Investkraft Schulinfra (Teil 2) - Alt- und Neubau (3.BA)	306	3.241.543,08	2.135.544,65	2.135.544,65	Anfang Sommerferien 2020	VWN-geprüft/VN-geprüft	fertiggestellt	Ende 2024
BSZ Lichtenstein - Investkraft Schulinfra (Teil 2)	307	1.586.274,61	1.188.410,68	1.188.410,68	Anfang Sommerferien 2020	VWN-geprüft/VN-geprüft	fertiggestellt	April 2023
BSZ für Bau- und Oberflächentechnik Außenstelle Limbach-Oberfrohna - Investkraft Schulinfra (Teil 2)	308	515.745,72	386.132,67	386.132,67	Anfang Sommerferien 2020	VWN-geprüft/VN-geprüft	fertiggestellt	Ende Herbstferien 2021
Gesamt		7.523.255,88	4.760.087,70	4.760.087,70				

Anlage 4: Bearbeitungsstand VwV Invest Schule (Stand: 22. September 2025)

VwV Invest Schule - Teil II			
Anzahl Maßnahmen		davon bewilligt und noch nicht abgeschlossen	davon abgeschlossen/Verwendungs-nachweisgeprüft
Gesamt	48	2	46
davon landkreiseigene Maßnahmen	4	0	4
davon Maßnahmen kreisangehöriger Städte und Gemeinden	44	2	42

Bearbeitungsstand VwV Invest Schule

Stand: 22. September 2025

